

मष्टा गाँउपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,
तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



मष्टा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
भातेखोला बभ्राङ्ग
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बभ्राङ्ग

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमि	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	5
२.२. भौतिक प्रगति	5
२.३. क्षमता विकास	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	9
५. नीति तर्जुमा	10
६. सहकार्य	10
७. आइपरेका समस्याहरु	10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	11
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	161
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	171
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	180

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मष्टा गाँउपालिका भातेखोला बम्हाङ्ग
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	७,००८,०७१।००	७,००८,०७१।००	६,५९०,९३५।००	९४.०४
	कार्यक्रम/चालु:	३,६३३,२२०।००	३,६३३,२२०।००	३,११२,७६४।००	८५.६७
	जम्मा	१०,६४१,२९१	१०,६४१,२९१	९,७०३,६९९	९१.१८
	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	स्थानीय तह	२,५६२,२२१।००	२,५६२,२२१।००	२,५६२,२२१।००	१००
	नेपाल सरकार	४,०१६,०००।००	४,०१६,०००।००	४,०१६,०००।००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	४,०६३,०७०।००	४,०६३,०७०।००	३,१२५,४७८।००	९०.८६
	जम्मा	१०,६४१,२९१	१०,६४१,२९१	९,७०३,६९९	९१.१८
	उपभोक्ताको Cash	१७५०००	१७५०००	१७२०००	९८.२८
	उपभोक्ताको Kind	५०९०७९६	५०९०७९६	५०३३७५६	९८.८७
	जम्मा	५२६५७९६	५२६५७९६	५२०५७५६	९८.८५
	कुल जम्मा	१५९०७०८७	१५९०७०८७	१४९०९४५५	९३.७२

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> ४ वटा ग्राभिटी खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरि ९८ घारा वाट ३११ घर धुरीका २००० जनाले खाने पानी उपभोग गरिरहेका छन् । २ वटा विद्यालयमा लैंगिक, अपांग तथा मर्यादित महिनावारी स्वच्छता मैत्री शौचालय निर्माण गरि ११७७ विद्यार्थी तथा शिक्षक लाभान्वित भई प्रयोगमा आयका छन् ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा १४४ वटा हात धुने स्टेसन र ७५ वटा फोहोर फाल्ने खाल्डो निर्माण कार्य सम्पन्न गरि प्रयोग मा आएका छन् ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● २ वटा सिचाई पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भई २४ घरधुरीका १२४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<p>यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाँउपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी तथा सरसफाई योजना रहेका ३ वटा घरवारी समूहका ८४ जनालाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा वीडियो सहयोग गरी सवैले तरकारी लगाई सामान्य आयआर्जन गर्ने गरेको छन ॥ ● २ जना पुरुषलाई ५ दिने बहुउद्देशिय नर्सरी तालिम संचालन गरि २ वटा बहुउद्देशिय नर्सरी स्थापना भएको छ । ● १० जना लाई अगुवा किसानका लागि व्यवसयिक तरकारी खेती तालिम लिई सवै जनाले तरकारी खेती वाट आमदानी गर्न थालेका छन ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ निर्माण कार्य सम्पन्न ४ वटा खानेपानीको मूहान वरिपरि वृक्षा रोपण गरिएको छ । ○ ४ वटा विद्यालयका बालकलव र ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा १११ पटक जलवायु परिवर्तन अनुकुलन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि अभिमुखिकरण गरिएको छ ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ११ जना लाई ४ दिने सरसफाई प्रज्वलक तालिम सम्पन्न भएको छ ● १ जना पुरुष लाई ७ दिने मर्मत सम्भार कार्यक्रता तालिम दिई सम्पन्न गरिएको छ । ● ३ वटा योजनाको निर्माण अवधिको योष्ठि सम्पन्न गरेको छ। ● ३ वटा योजनामा १ दिने लेखा व्यवस्थापन पुर्नताजकिय तालिम सम्पन्न गरिएको छ । ● ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको २१२ दिने निर्माण पश्चातको गोष्ठी तथा सामाजिक परिक्षण तालिम सम्पन्न गरिएको छ । ● ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको पानी सुरक्षा योजना तालिम सम्पन्न गरिएको छ ● ४ वटा खाने पानी तथा सरसफाई योजनामा महिला धारा आमा समूहलाई सरसफाई तथा सच्छता र मर्मत सम्भार सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरिएको छ । ● मर्यादित महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि घरायसी स्तरमा पाईने कपडा र सेनिटरी प्याड सम्बन्धि विद्यालय र समुदाय स्तरमा १ ।१ दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ । ● मर्यादित महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि घरायसी स्तरमा पाईने कपडा र सेनिटरी प्याड सम्बन्धि ८ वटा विद्यालयका १२ जना शिक्षिकाहरुलाई २ दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ । ● मष्टा गा पा वडा ३ र ४ कार्यालय संगको समन्वयमा विश्व हात धुने दिवश , विश्व पानी दिवश , अन्तराष्टिय महिला दिवश, महिनावारी स्वच्छता दिवश , विश्व वातावरण दिवश र राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह विभिन्न चेतना तथा सन्देशमुलक कार्यत्रम मार्फत सम्पन्न गरिएका छन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाँउ पालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।१४ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत रकम निकास भै ९३.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ९३७,५९२ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. २,५६२,२२१ मध्ये रु. २,५६२,२२१ खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १००% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ८ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा बृंगल नगरपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. ४वटा ग्राभिटि खानेजानी तथा सरसफाई योजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरि ९८ घारा वाट ३११ घर धुरीका २००० जनाले खाने पानी उपभोग गरिरहेका छन ।

२. २ वटा विद्यालयमा लैगिक, अपांग तथा मर्यादित महिनावारी स्क्छता मैत्री शौचालय निर्माण गरि ११७७ विद्यार्थि तथा शिक्षक लाभान्वित भई प्रयोगमा आयका छन

३. ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा १४४ वटा हात धुने स्टेसन र ७५ वटा फोहोर फाल्ने खाल्डो निर्माण कार्य सम्पन्न गरि प्रयोग मा आएका छन ।

४ २ वटा सिचाई पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भई २४ घरधुरीका १२४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	४ वटा	२०००	५	२०००	१०० %	१०० %
२	सिँचाई योजनाहरु	२ वटा	८४	२	८४	१०० %	१०० %
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	२ वटा	१०७७	२	१०७७	१०० %	१०० %
४	घरवारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	३ वटा	९०	३	८४	१००%	९३.३३%
५	आधारभुत ३रवारी व्यवस्थापन पुर्नताजगी तालिम						
६	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)						
७	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)						
८	पोखरी संरक्षण						
९	मुल संरक्षण						

१०	अन्य						
----	------	--	--	--	--	--	--

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१		○

नगरपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ११ जना लाई ४ दिने सरसफाई प्रज्वलक तालिम सम्पन्न भएको छ
- १ जना पुरुष लाई ७ दिने मर्मत सम्भार कार्यक्रमा तालिम दिई सम्पन्न गरिएको छ ।
- ३ वटा योजनाको निर्माण अवधिको योषि सम्पन्न गरेको छ
- ३ वटा योजनामा १ दिने लेखा व्यवस्थापन पुर्नताजक्रिय तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको २२ दिने निर्माण पश्चातको गोष्ठी तथा सामाजिक परिक्षण तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको पानी सुरक्षा योजना तालिम सम्पन्न गरिएको छ
- ४ वटा खाने पानी तथा सरसफाई योजनामा महिला धारा आमा समूहलाई सरसफाई तथा स्वच्छता र मर्मत सम्भार सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- मर्यादित महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि घरायसी स्तरमा पाईने कपडा र सेनिटरी प्याड सम्बन्धि विद्यालय र समुदाय स्तरमा ११९ दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- मर्यादित महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि घरायसी स्तरमा पाईने कपडा र सेनिटरी प्याड सम्बन्धि ८ वटा विद्यालयका १२ जना शिक्षिकाहरुलाई २ दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- मष्टा गा पा वडा ३ र ४ कार्यालय संगको समन्वयमा विश्व हात धुने दिवश , विश्व पानी दिवश , अन्तराष्टिय महिला दिवश, महिनावारी स्वच्छता दिवश , विश्व वातावरण दिवश र राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह विभिन्न चेतना तथा सन्देशमुलक कार्यत्राम मार्फत सम्पन्न गरिएका छन् ।

तालिका ४ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	६८	१४	०	०	३३९	१२५	४०७	१३९
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	९	१	०	०	६७	३३	७६	३४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी	४	०	०	०	६७	२४	७१	२४

विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु									
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१०	२	१०	२	
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१	४	०	०	२४	२४	२५	२८	
जम्मा	८२	१९	०	०	५०७	२०८	५८९	२२७	
प्रतिशत :	१२.३७				८७.६२		७२.१८	२७.८१	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस नगरपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी :

- खानेपानी तथा सरसफाई योजना रहेका ३ वटा घरबारी समूहका ८४ जनालाई घरबारी व्यवस्थापन तालिम तथा वीउ सहयोग गरी सबैले तरकारी लगाई सामान्य आयआर्जन गर्ने गरेको छन ॥

२. आयआर्जन :

- २ जना पुरुषलाई ५ दिने बहुउद्देशिय नर्सरी तालिम संचालन गरि २ वटा बहुउद्देशिय नर्सरी स्थापना भएको छ ।
- १० जना लाई अगुवा किसानका लागि व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम लिई सबै जनाले तरकारी खेती वाट आमदानी गर्न थालेका छन ।

३. सहकारी:

- मष्टा पा ४ मा रहेको एकिकृत कृषि सहकारी संस्था लि को क्षमता विकास गर्ने क्रममा सहकारी संस्थाको ५ वटा बैठक सहजिकरण र १ पटक वार्षिक साधारण सभा मा सहजिकरण गरिएको छ । गत वर्ष सहकारी संस्था का प्रवन्धक र सहप्रवन्धक लाई सहकारी लेखा ऋण तथा कार्यलय व्यवस्थापन तालिम दिईएको छ । तालिम पश्चात सहकारीको अर्धवार्षिक र वार्षिक खाता वन्दी मा पहिले अरु दक्ष ब्यक्तिलाई बोलाउने गरेको मा हाल सहकारी आफैले खाता वन्दी लगायत अन्य सबै कार्य गर्ने गरेको छ, भने प्रवन्धक तालिम सहजिकरण गर्न सक्ने समेत भएका छन ।

४. लघु उद्यम :

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन :

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३,४	०	०	८६	८६	४	०	८०	८४	४	०	१६६	१७०
जम्मा	०	०	८६	८६	४	०	८०	८४	४	०	१६६	१७०

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	३	०	२७	३०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१	०	१	२
५	एग्रोभेट				
जम्मा		४	०	२८	३२

तलिका७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		एकिकृत कृषि सहकारी संस्था लि भातेखोला बभ्नाड.			
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति कृषक समूह संख्या	२१ वटा			
२	शेयर धनीहरूको संख्या	४७०	महिला २९०	पुरुष १८०	दलित ९०
३	कुल सम्पत्ती रु.	२००९९९			
४	कुल ऋण लगानी रु.	३०५५०२०			
५	असूली दर	१०० %			
६	खुद नाफा रु.	१६७०९९			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.	०			
८	जगेडा कोष रु.	४३९९९			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१४५ प्रतिशत			

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

नगरपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि समिती गठन नगरेको र परियोजना व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिका र सम्बन्धित वडाका सरोकारवालाहरूले अनुगमन गरिएको छ ।

तलिका८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	नगरपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	आल्यामेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३ वटा		३ वटा	३ जना
२	भिन्मड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३ वटा		३ वटा	५ जना
३	तोलासडा खाने पानी तथा सरसफाई योजना	३ वटा		३ वटा	५ जना
४	मुलडाँडा खाने पानी तथा सरसफाई योजना	३ वटा		३ वटा	६ जना
५	कुलाष्ट्रजन मा वि संस्थागत शौचाल योजना	३ वटा		२ वटा	५ जना
६	मालिका नि मा वि संस्थागत शौचालय	३ वटा		२ वटा	५ जना
७	तिलाचौर स्वाईल सिमेन्ट पोखरी	३ वटा		२ वटा	४ जना

८	ठाना स्वाईल सिमेन्ट पोखरी	३ वटा	२ वटा	५ जना
	जम्मा	२४	२०	

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२ पटक	१२ वटा	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३ वटा	३ वटा	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१ वटा	१ वटा	
	जम्मा	१६ वटा	१६ वटा	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा अँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१		०	
२		०	

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५/१०/१०	<ul style="list-style-type: none"> सहयोगी संस्था र गाउँपालिका विच सम्झौता गर्ने तोलासडा खाने पानी र मालिका नि मा वि संस्थागत शौचालय निर्माण संचालन गर्ने परिमार्जित बजेट अनुमोदन गरिएको प्रस्तावित खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको विस्तृत सर्भेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको परियोजना अन्तरगत काम गर्ने फिल्ड कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय सरसफाई सहजकर्ता तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको स्थानिय स्रोत व्यक्ति छनौट गर्ने र तालिम दिने निर्णय गसरिको परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक भक्ता कायम गरिएको निर्णय गरिएको
२	२०७६/०२/१०	<ul style="list-style-type: none"> स्मार्ट सेनिटोप्याड भेन्डीङ मेसिन खरिद गरि जडान गर्ने निर्णय भएको खेती सानासिचाँई को काम सुचारु गर्न ताकेता गर्ने निर्णय गरिएको

	<ul style="list-style-type: none"> ● मुलडाँडा खानेपानी लाई ताकेता गरि काम छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको ● परियोजनाको गापा अन्तरगतको बजेट परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको ● सम्पन्न योजनाको अवस्था अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरिएको ● प्रस्तावित खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको चरणबद्ध तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको ● संचालित योजनाको मूहान संरक्षणको लागि पुर्नभरण पोखरी र वृक्षा रोपण गर्ने निर्णय गरिएको ● भवानी प्रा वि भिन्मडमा हिल टयांक खरिद गरि जजान गर्ने निर्णय गरिको
--	---

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- १.
- २.
- ३.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	मष्टा गाँउ पालिका ,एकिकृत विकास मञ्च ,सुआहारा म	महिला हिंशा विरुद्धको १६ दिने अभियान	साभेदारीमा कार्यक्रम संचालन	बराबर
२	मष्टा गा पा	सरसफाई सहजकर्ता तालिम तथा परिचालन	समन्वयमा संचालन	गा पा वाट १० जना परियोजनावाट १ जना

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	समूदायक मानिसहरुले श्रमदान काम गर्नको लागि सक्रियता नदिनु	○ समूदायमा छलपपल गरि उपभोक्ता समिति द्वारा उसभोक्तालाई श्रमदान गराइएको ।
२.		○



अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	निर्माण अवधिको गोष्ठी	३,४	१ दिन	३	१	०	०	०	१८	१८
२	लेखा व्यवस्थापन पुर्नताजकिय तालिम	३,४	१ दिन	३	१	०	०	०	१८	१८
३	निर्माण पश्चातको गोष्ठी र सामाजिक परिक्षण तालिम	३,४	२ दिन	४	५	६	०	०	३८	३६
३	पानी सुरक्षा योजना तालिम	३,४	३ दिन	४	८	४	०	०	३९	३८
४	महिला धारा आमा समूहलाई सरसफाई स्वच्छता र मर्मत सम्भार अभिमुखिकरण	३,४	१	४	५२	०	०	०	२१०	०
५	योजना दिगो व्यवस्थापन तालिम	३,४	२ दिन	१	१	४	०	०	६	१५
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	महिनावारी स्वच्छता दिवश	४	१ दिन	१	९	१	०	०	६५	३१
२	विद्यालय वास सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी	४	२ दिन	१	०	०	०	०	२	२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	बहु उद्देशिय नसरी नाईके तालिम	४	४ दिन	१	०	१	०	०	०	१
२	अगुवा किसानहरुलाई ब्यवसायिक तरकारी खेती तालिम	३,४	४ दिन	१	०	०	०	०	६	४
३	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	३,४	३ दिन	३	४	०	०	०	६१	१९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत सम्भार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	स्थानिय मर्मत सम्भार कार्यक्रता तालिम	४	७ दिन	१	०	०	०	०	०	१
२	सरसफाई प्रज्वलक क्षमता विकास तालिम	३,४	४ दिन	१	०	०	०	०	१०	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
२	बहु उद्देशिय नसरी नाईके तालिम	४	४ दिन	१	०	०	०	०	०	१
३	अगुवा किसानहरुलाई ब्यवसायिक तरकारी खेती तालिम	३,४	४ दिन	१	०	०	०	०	६	४
४	स्थानिय मर्मत सम्भार कार्यक्रता तालिम	४	७ दिन	१	०	०	०	०	०	१

५	सरसफाई प्रज्वलक क्षमता विकास तालिम	४	४ दिन	०	०	०	०	०	१०	१
६	विद्यालय बास तथा स्वच्छता सामग्र सम्बन्धि कार्यशाला	४	२ दिन	१	०	०	०	०	२	२
७	योजना दिगो व्यवस्थापन तालिम	३,४	२ दिन	२	१	४	०	०	६	१५

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा लेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरू MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरूको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न बर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको रकम	योजना को अवस्था	कैफीयत
१	तेलपारा भौधारा खा पा यो	२०७४	५,२०४,६१९।६७	ग्राभिटी	रामलाल धामी			
२	कैसेडी खानेपानी तथा सुसफाई योजना	२०७४	५,१६६,७६७।३२	ग्राभिटी	रामधन कठायत			
३	सिम्ला किमचाका खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२०७५	२,४६४,५२१।५५	ग्राभिटी	धनचडी थापा	०	राम्रो	
४	तिलाचौर खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२०७५	२,००५,२९६।९२	ग्राभिटी	शंकर व. सेटी		राम्रो	
५	आलेमेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२०७६	४,६६१,७१२।६६	ग्राभिटी	अफिलाल बुढा		राम्रो	
६	भिन्मड खाने पानी तथा सरसफाई योजना	२०७६	३,२६३,७९३।९६	ग्राभिटी	विरेन्द्र कठायत	९४०००	राम्रो	
५	मुलडाँडा खाने पानी तथा सरसफाई योजना	२०७६	५,९६३,३४४।६६	ग्राभिटी	जगत ब खड्का	१३६०००	राम्रो	
६	तोलासडा खाने पानी तथा सरसफाई योजना	२०७६	१,४४७,६४२।३६	ग्राभिटी	अफिलाल खड्का	०	राम्रो	
७	तिलाचौर स्वाइल सिमेन्ट पोखरी	२०७६	२२६,९११।३९	बहुउपयोगी	शकर सेटी	०	राम्रो	

८	ठाना स्वाईल सिमेन्ट पोखरी	२०७६	१६५,८०९।७०	बहुउपयोगी	मान ब. फराडा	०	राम्रो	
९	कुलमष्टजन संस्थागत शौचाल यो	२०७६	१,९४९,५३०।१५	ग्राभिटी	अफिलाल जोशी	०	राम्रो	
१०	मालिका नि मा वि संस्थागत शौचालय	२०७६	१,२००,७१३।७८		जोग ब. धामी	०	राम्रो	

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ वांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद वांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु वांकी रकम रु	कैफीयत


अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

छात्रामैत्री शौचालय निर्माण संगै सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन जडानले विद्यालयमा छात्राहरुको निरन्तरता बढ्दै



मष्टा गाउँपालिका वडा नं ३,४ स्ति श्री कुलमष्टाजन मा बि भातेखोलामा पूर्ण सरसफाइको स्थिति निकै दयनिय थियो । त्यस विध्यालयमा २ वटा अब्यबस्थित शौचालय, सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको ब्यबस्था नभएको, फोहोरफाल्ने खाडलको ब्यबस्था नभएको, भवनको उचित ब्यबस्था नभएको, मिन्स भएकोबेला छात्राहरु विध्यालयमा अनुपस्थित हुने र बाल क्लव गठन नभएको ले सरसफाइको अबस्था कमजोर थियो

RVWRMP / गाउँपालिकाको समन्वयका कारण ब्यबस्थित शौचालय, सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको ब्यबस्था , फोहोरफाल्ने खाडलको ब्यबस्था, भवनको उचित ब्यबस्था भएको, मिन्स भएकोबेला छात्राहरु विध्यालयमा उपस्थित हुने र बाल क्लव गठन भएकोले सरसफाइको अबस्थामा निकै परिवर्तन भएको छ । विध्यालयमा मात्र पूर्ण सरसफाइ नभएर छात्रा छात्रहरुले आ आफ्नो घरमा पूर्ण सरसफाइलाइ सदुपयोग गरेका छन । कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा बिज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना भै नियमित संचालन भएको र बिगतमा ३९ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धी थियो भने हाल ६८ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धी भएको कुरा त्यस विद्यालयका प्र अ ले बताउनु भएकोछ ।

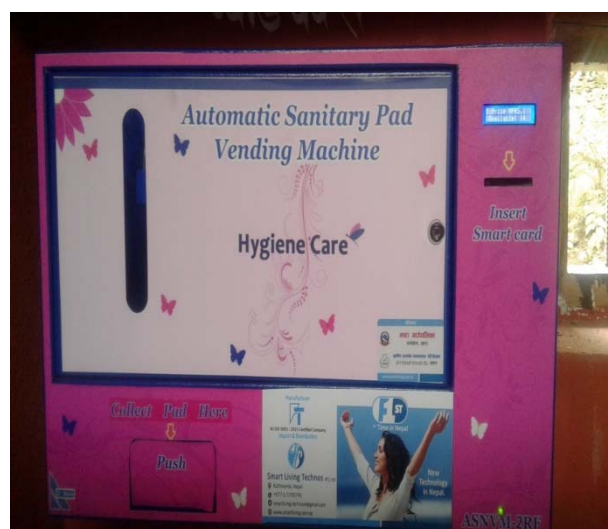

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी



अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	नाम थर	पद	ठेगाना	सम्पर्क न.	
१	ललित कुमार सिंह	फिल्ड संयोजक	तल्कोट गा पा	९८६८८६९९३९	
२	नर व बोहरा	सव ईन्जिनियर	सुर्मा गा पा	९८६८४१०५९९	आंशिक
३	सुसिला थापा	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	खप्तड छान्ना गा पा २	९८६५८३३०३८	
४	राम व. साकी	जलस्रोत प्राविधिक	ज न.पा ९	९७४९००२५१८	
५	गगन व. धामी	जिविकापार्जन प्रवर्द्धक	तलकोट गा पा	९८४८४८१६१७	आंशिक
६	अनिशा खड्का	सरसफाई प्रज्वलक	मष्टा गा पा ४	९८४६९९०१३५	
